

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2015
KRYTERIA OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych**

Oznaczenie arkusza: **E.03-01-15.05**

Oznaczenie kwalifikacji: **E.03**

Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

*Egzaminator wpisuje T,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo N, jeżeli
nie spełnił*

Rezultat 1. Zmontowany układ elektropneumatyczny

1	Na szynie TH35 zamontowane jest przekaźnik pomocniczy z cewką na napięcie 24 V DC.						
2	Przekaźnik zamontowany jest na szynie montażowej pewnie, nie zsuwa i nie odpina się.						
3	Na płycie montażowej zamontowany są: zawór pneumatyczny bistabilny 5/2 sterowany ręcznie, zawór pneumatyczny 3/2 monostabilny z cewką na napięcie 24 V DC, zawór dławiąco-zwrotny, zawór redukcyjny, manometr, zespół otrzymywania sprężonego powietrza.						
4	Na płycie montażowej zamontowane są: siłownik dwustronnego działania oraz siłownik jednostronnego działania i są one pewnie przytwierdzone do podłoża.						
5	Na płycie montażowej zamontowany został elektryczny łącznik krańcowy w takim miejscu, że jego styk jest zwarty, gdy tłoczysko siłownika 2A jest wsunięte.						
6	Połączenia pneumatyczne wykonane są zgodnie ze schematem z rys. 2.						
7	Połączenia elektryczne wykonane są zgodnie ze schematem z rys. 1.						
8	Elementy rozłożone na płycie montażowej zgodnie ze schematem z rys. 3.						
9	Na wszystkie przewody elektryczne założone są końcówki tak, że nie wystają z nich odizolowane żyły i końcówki nie spadają z przewodów.						
10	Wszystkie przewody elektryczne podłączone są w sposób pewny, nie wysuwają się spod zacisków.						

Numer
stanowiska


Rezultat 2. Ocena jakości wykonania montażu i opis działania układu									
1	W ocenie montażu elektrycznego w tabeli zapisy są zgodne ze stanem faktycznym.								
2	W ocenie poprawności wykonania montażu w punktach od 7 do 11 tabeli zapisy są zgodne ze stanem faktycznym.								
3	Pozycja 12 i 15 w tabeli – odpowiedź tak.								
4	Pozycja 16 i 17 w tabeli – odpowiedź tak.								
5	Pozycja 13 i 14 w tabeli – odpowiedź nie.								
6	Pozycja 18 i 19 w tabeli – odpowiedź nie.								
Przebieg 1. Montaż mechanicznego i elektrycznego układu elektropneumatycznego									
1	Przy wyborze elementów elektrycznych zdający sprawdził ich stan za pomocą multimetru.								
2	Przy wyborze siłowników zdający sprawdził, czy tłoki wysuwają się bez oporu.								
3	Zdający używał narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem.								
4	Prace montażowe wykonywane były przy wyłączonym napięciu i przy odłączonym sprężonym powietrzu.								
5	Zdający sprawdził ciągłość przewodów multimetrem.								

Egzaminator


imię i nazwisko

.....


data i czytelny podpis

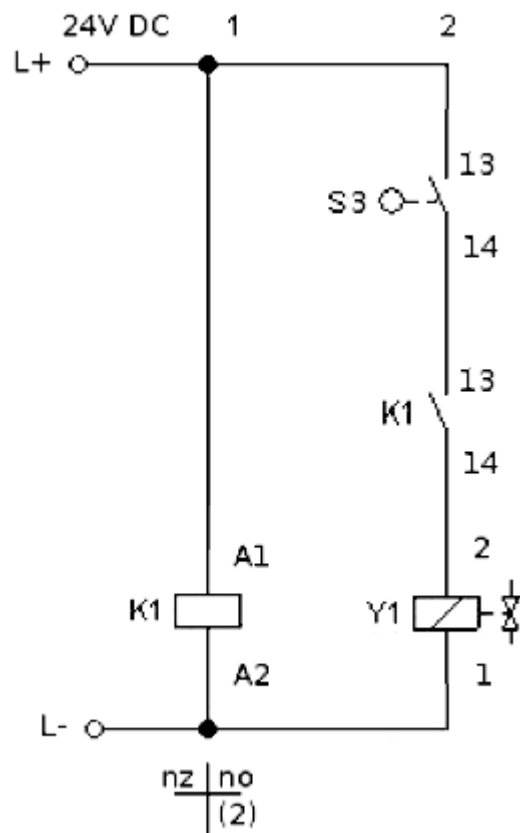

Rysunek 1. Schemat połączeń elektrycznych układu elektropneumatycznego

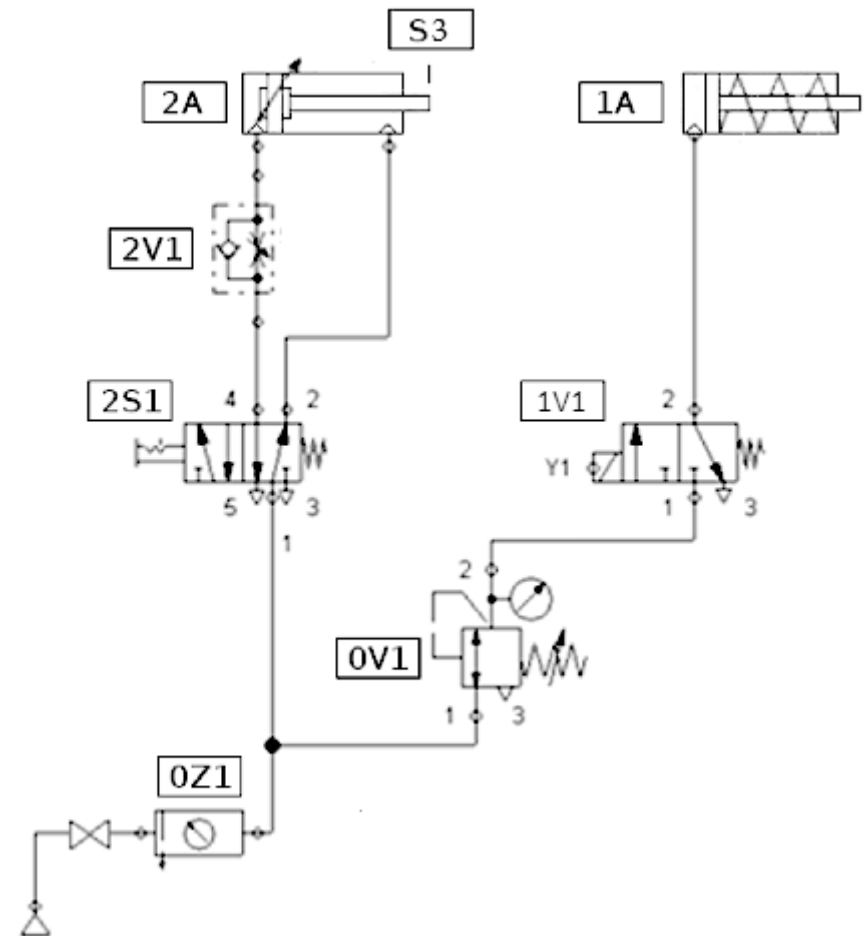

Rysunek 2. Schemat połączeń pneumatycznych układu elektropneumatycznego

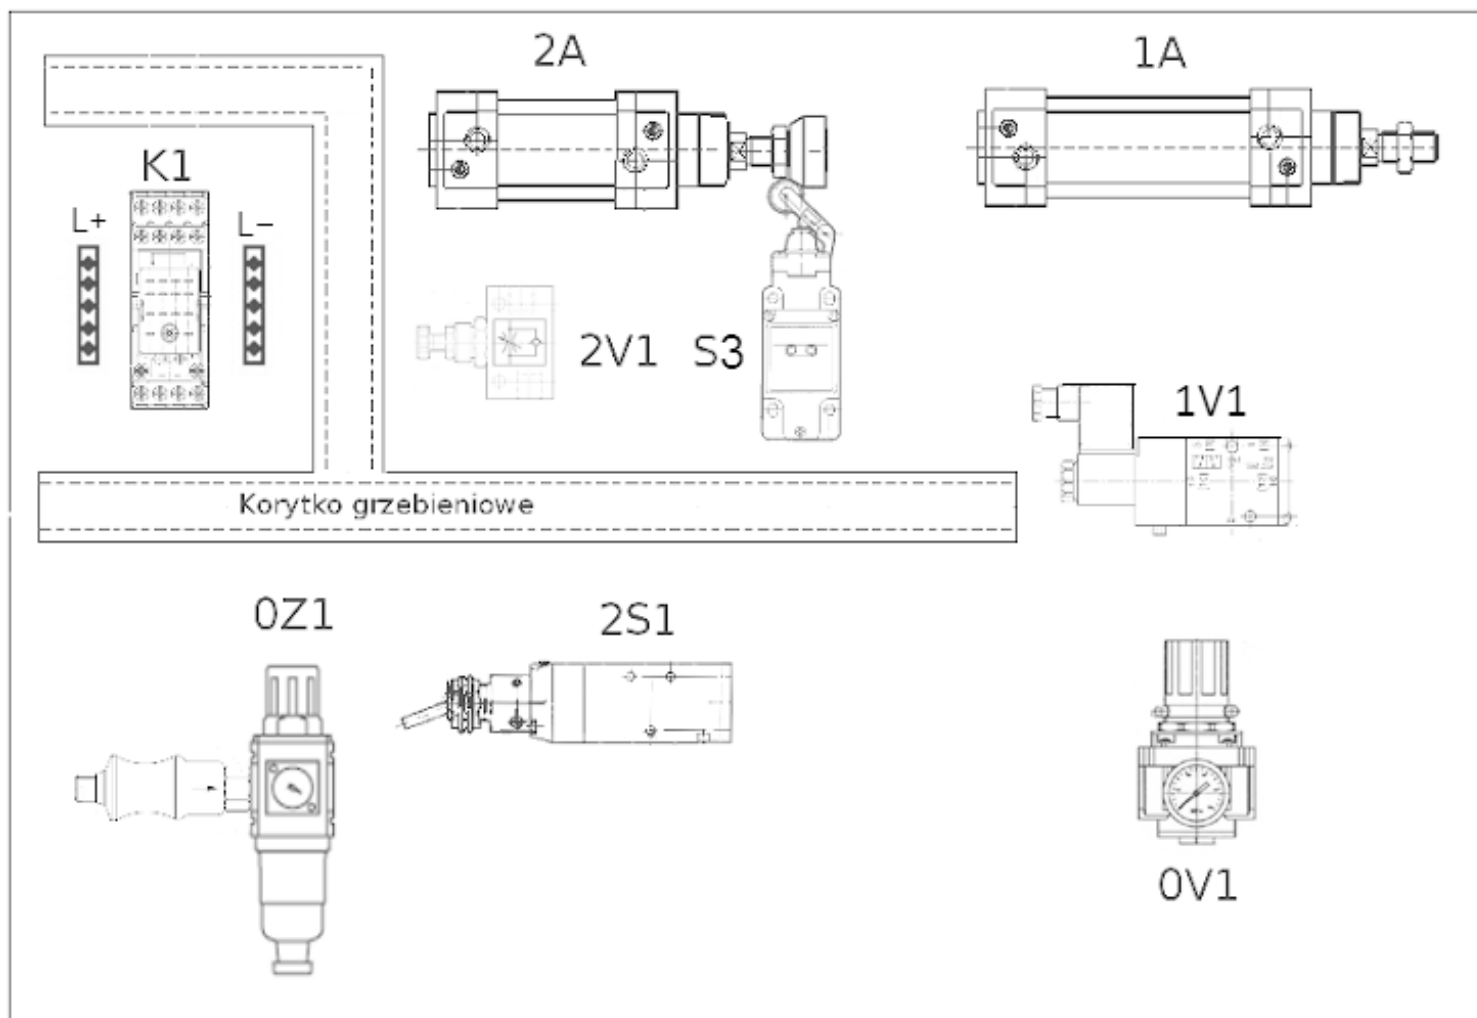

Rysunek 3. Schemat rozmieszczenia elementów układu elektropneumatycznego na płycie montażowej
